


Extension VirtualData : Situation Février 2019

Journée CPER, IPNO, 18/2/2019

Localisation

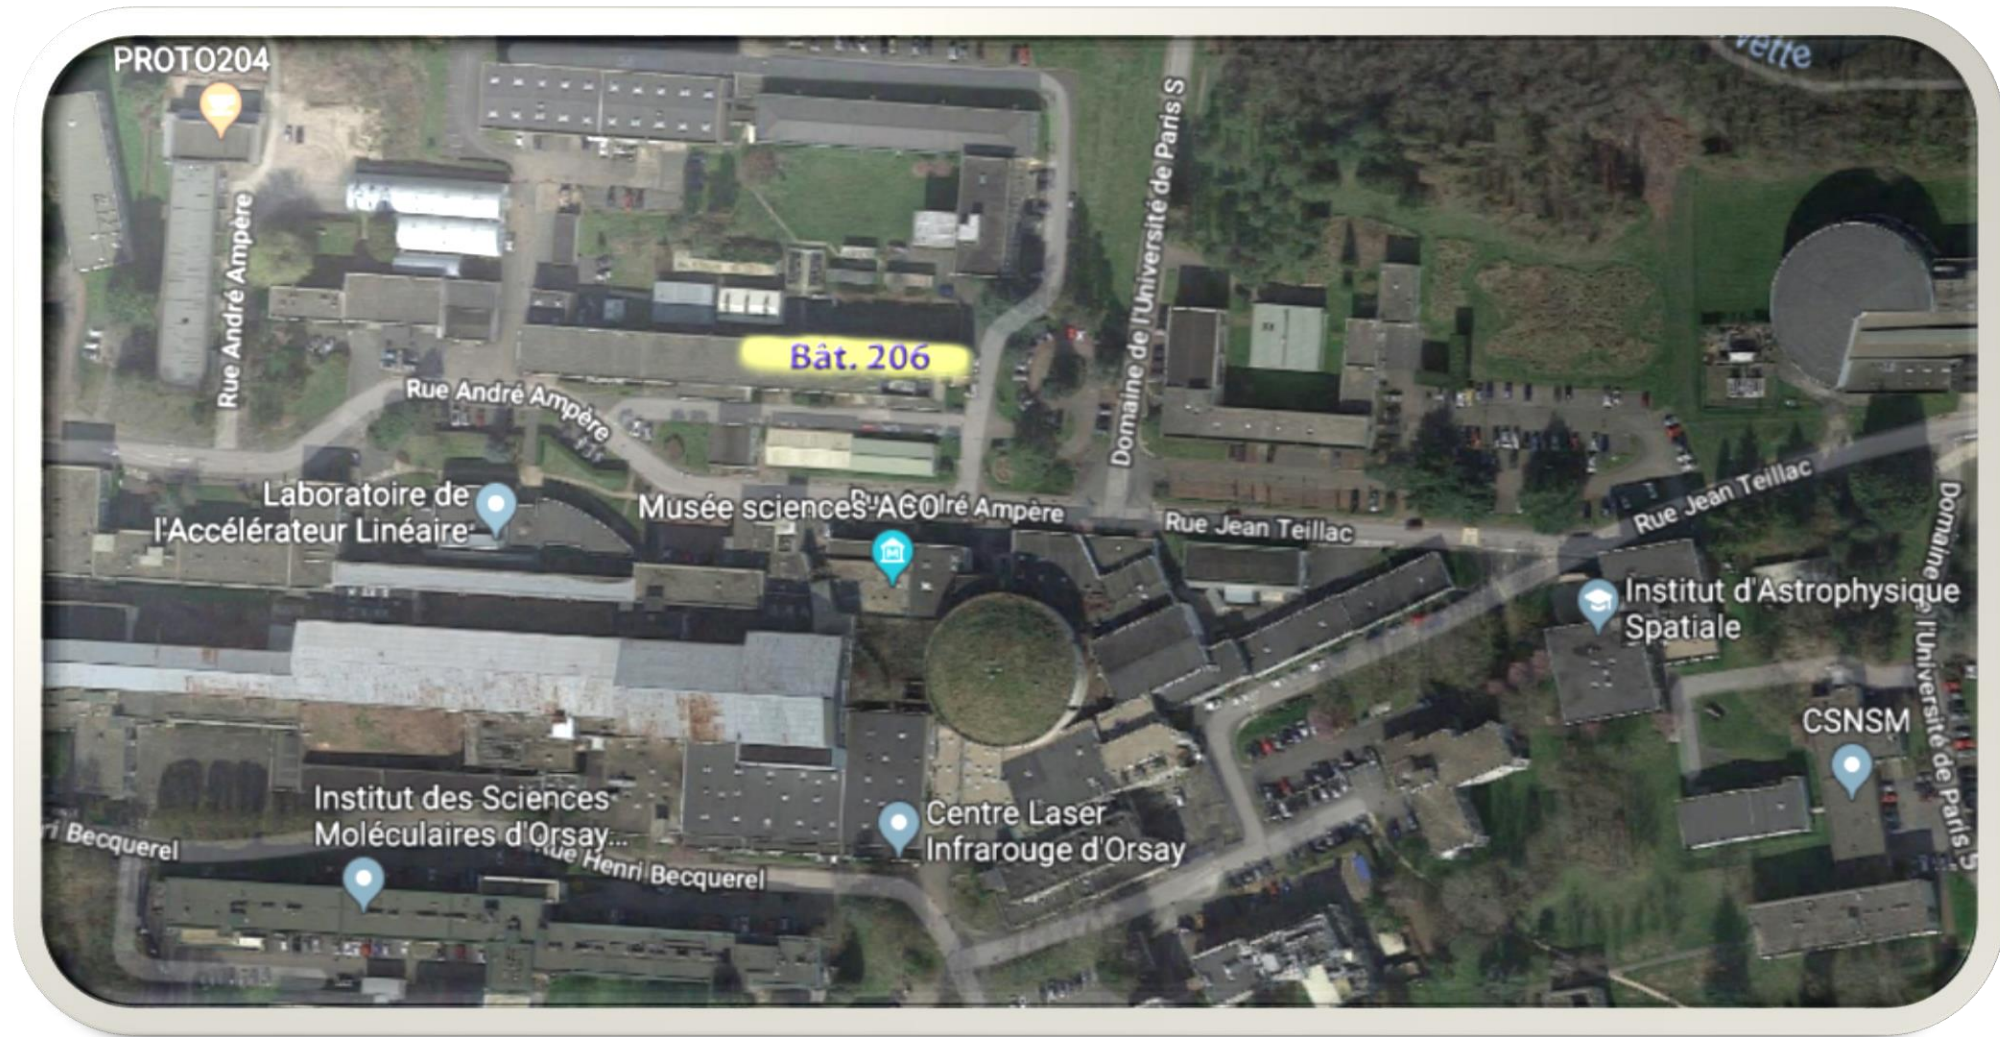

Rappel Objectif

- Etendre la capacité du datacenter VirtualData (bat. 206) aménagé en 2013
 - Aménagement second œuvre de la totalité de la surface (220 m², dont 100 actuellement aménagés)
 - Ajouter 21 racks vides et leur refroidissement (30 actuellement installés)
 - Permettre d'héberger 600 kW de matériel informatique (250 kW actuellement installés) dont 300 kW avec une double alimentation sur les 2 circuits HT pour une plus grande disponibilité
- Accès PMR : installation ascenseur
- Isolation thermique des pièces bureau et atelier (double vitrage)
- Contribution à la jouvence des installations de l'université (circuit HT, hangar)
- Détails : voir [journée CPER 2018](#)

Vues extérieures



Evènements des 12 derniers mois

- Hiver 2018 : APD
 - Confirmation du budget prévisionnel : 2,1 M€ HT (y compris aleas, MOE, ...)
- Printemps – Eté 2018 : DCE
- Octobre 2018 : publication du DCE travaux
 - Base + 7 options (dont 4 hautement désirables ~90 k€)
 - 7 lots (GO/SO, CVC, CFO, Faux plancher, ascenseur, racks, PDUs)
- Décembre 2018 : ouverture des plis
 - Offres pour la base légèrement inférieure au prévisionnel, avant négociation
- Janvier 2018 : négociation
 - Amélioration des offres initiales

Situation Actuelle

- Réunion pour sélection finale des offres vendredi 22/2
 - Devrait entériner base + les 4 options souhaitées (isolation, sanitaires, démolition hangar, jouvence circuit HT)
- Ouverture chantier prévisionnelle : mi-mars
- Durée prévisionnelle : 30 semaines
 - Fin octobre... mais tenir compte des vacances d'été donc plutôt fin novembre...
 - Environ 8 mois de retard en 1 an... mais ça avance !!
 - Principaux aléas seront « levés » une fois l'ascenseur réalisé (T0 + 3 mois) : lié au creusement de la fosse, même si plusieurs sondages effectués
- Journée CPER 2020 : champagne !!!
